

昌图县农田基本建设工作领导小组文件

昌农基建通字〔2023〕6号

关于秋冬农田基本建设进展情况的通报

领导小组各成员单位、各镇（农垦集团）：

全县 2023-2025 年度涝区系统（农田水利基本建设）治理工程已全部开工建设，从目前掌握的情况看，整体工程进度相比去年同期有明显提升，开局良好。

为扎实做好下一步涝区系统治理工作，请相关各镇（农垦集团）再接再厉，根据季节特点科学合理安排，严密组织实施，在保证施工质量及安全的基础上，加快推进工程施工进度。现将截止 12 月 5 日全县 2023-2024 年度涝区治理工程进展情况通报如下。

一、工程建设完成情况

昌图县 2023-2024 年涝区治理工程总计划任务为 1209.6232 千米，其中重点涝区为 908.649 千米，非重点涝区为 300.9292 千米。

目前完成总清淤长度为 658.1952 千米，完成比例为

54.41%；其中重点涝区完成 464.676 千米，完成比例为 51.13%，非重点涝区完成 193.5192 千米，完成比例为 64.31%。

其中：**重点涝区**的宝力镇、古榆树镇、七家子镇、通江口镇、长发镇、三江口农垦完成任务量均超出 60%；完成任务量低于 20%的镇（农垦集团）为两家子农垦。

非重点涝区的昌图镇、毛家店镇、头道镇已完成全部涝区治理建设任务；亮中桥镇、泉头镇、双庙子镇、四合镇、太平镇、下二台镇、此路树镇已超额完成本年度建设任务。

前双井镇、三江口镇、古榆树镇、宝力镇等镇年度计划任务均为 100 千米左右，建设任务较重，但这些镇迎难而上、不等不靠、积极组织施工，进度也较快，也取得良好效果。

二、存在的主要问题

1. 个别镇(农垦集团)施工进展仍旧比较缓慢，主动性不强。主要领导要高度重视，亲自安排部署，充分利用当前施工有利时机，要克服困难，抓紧推进施工进度。

2. 部分渠道开挖坡比未达到使用标准。个别镇渠道开挖款宽度或高度不满足设计行洪需求，需要进行整改。

3. 个别镇已完成的排涝区域渠系之间、干支沟渠之间有的尚未连通，施工不够科学，需要进一步优化施工方案，抓紧查缺补漏，尽快达到沟渠连通的设计要求。。

三、下步要求

一是各镇(农垦集团)主要领导要深入一线, 准确掌握施工进度情况, 加强规划督导, 及时修改完善施工计划, 确保工程进度和质量; 二是已完工及正在施工的渠道, 务必按设计标准做好整形工作, 有效保证渠道的开口宽度及深度, 防止来年汛期排水发生渠道坍塌等问题; 按照渠道互通要求, 结合实际情况, 防止发生渠道不畅、沟渠不通等问题; 三是有效保证施工安全。各镇(农垦集团)结合冬季施工的实际情况, 严格落实安全工作责任, 加强施工安全的预想预测, 特别在施工作业中务必安排1名安全员全程进行提醒; 四是全力做好协调督导, 县直有关部门要按照承担任务各司其职, 协调、督导、保障各镇(农垦集团)实施好全县农田基本建设涝区系统治理工作。

附件1: 昌图县2023-2024年度涝区治理工程进度表

附件2: 昌图县农业农田基本建设工作简报(全县涝区治理工作经验推广)

昌图县农田水利建设工作领导小组办公室

2023年12月5日

附件 1:

昌图县 2023-2024 年度涝区治理工程进度表

序号	镇（农垦）	计划任务量（千米）	完成任务量（千米）	完成率(%)
重点涝区				
1	宝力镇	90.6492	59.1	65.20%
2	金家镇	20.59	14.657	71.19%
3	三江口镇	104.0452	59.961	57.63%
4	古榆树镇	103.5948	66.098	63.80%
5	付家镇	74.2096	37.3	50.26%
6	前双井镇	107.036	44.251	41.34%
7	七家子镇	49.396	35.4	71.67%
8	大四家子镇	75.456	25.797	34.19%
9	曲家店镇	60.7152	24.21	39.87%
10	通江口镇	58.95	36.47	61.87%
11	后窑镇	51.468	16.88	32.80%
12	长发镇	24.5744	18.432	75.00%
13	宝力农垦	20.0196	5.95	29.72%
14	两家子农垦	47.99	4.45	9.27%
15	三江口农垦	20	15.72	78.60%
非重点涝区				

1	八面城镇	17.156	5.5	32.06%
2	昌图镇			已完成
3	老城镇	5.14	2.81	54.67%
4	毛家店镇			已完成
5	亮中桥镇	9.25	18.45	199.46%
6	泉头镇	9.2462	10	108.15%
7	双庙子镇	5.0272	5.0272	100.00%
8	四面城镇	46.5336	19.699	42.33%
9	此路树镇	14.3738	16.003	111.33%
10	老四平镇	17.6843	7.23	40.88%
11	四合镇	28.4744	28.54	100.23%
12	朝阳镇	17.133	9.9	57.78%
13	头道镇			已完成
14	马仲河镇	5.5724	3.91	70.17%
15	大洼镇	22.7112	12.81	56.40%
16	东嘎镇	45.7328	19	41.55%
17	十八家子镇	9.0976	2.9	31.88%
18	太平镇	0.723	2	276.63%
19	下二台镇	7.2105	7.56	104.85%
20	平安堡镇	24.4348	18.5	75.71%
21	大兴镇	11.398	3.3	28.95%
22	新乡牯牛农场	2.9584	1	33.80%

昌图县农田基本建设工作

简 报

昌图县农建领导小组办公室

2023年12月5日

县委书记范磊对《关于秋季农田基本建设进展情况的通报》（昌农基建通字〔2023〕5号）作出了重要批示：“今秋农建工作总体形势向好，请各镇进一步加强组织领导，加快进度，提高质量，建精品工程。进度缓慢地区要抓紧推进，迎头赶上，水利部门要加强指导和督促检查，确保工程质量”。

请各镇（农垦集团）在全县涝区系统治理工程中，按照范磊书记的批示要求，克服资金不足、施工周期较长、天气寒冷等不利因素，科学谋划，精心组织，确保今冬明春的农田基本建设任务圆满完成。

在今年的农田基本建设中涌现出很多推进速度快、工程质量好、发挥作用强、百姓口碑好的成功经验和动人故事。本期简报将对部分镇关于涝区治理好的成功经验及典型做法进行交流。

一、带头实干的榜样：七家子镇榆树村

今年7月，极端天气再次来袭，七家子镇榆树村遭遇持续的强降雨，韩顺线防汛路排水沟堵塞严重，机械根本无法作业，只能采取最原始的人工开挖，肩挑手扛疏通渠道。党支部书记张振伟当机立断，带领党员和村民顶着雷鸣暴雨清理排水沟渠，暴雨过后顶着炎炎烈日继续施工，衣服湿透了就光起了膀子干，后背晒掉皮了就硬生的把皮扯下来也不间断施工，在大家的一起努力下，终于在最短的时间内实现了渠道全线贯通，为抵御下一次可能发生洪涝灾打好基础。



七家子镇榆树村夏季施工现场

张振伟带领的村班子在今年冬季清淤开始前，带着班子成员走屯串户了解哪些地块需要新修，哪些地块需要清淤，遵照历史沟渠和村民商定，根据实际需求做好规划等准备工作，并提前开始实施清淤挖沟排内涝工作。带领榆树村自筹

资金，对全村干渠进行清淤，然后再按照严重地段逐步进行清理。截至目前，全村共修建清理沟渠 14 千米，土方量达到 5 万余立方米，受益土地五千多亩，不仅提高农田排水效力和粮食增产增收，也为农村水利设施和乡村振兴打下良好基础，并受到村民的一致好评，深得民意。

该村目前常备 3 台大型挖掘机，长期值班值守，闻令而动，随时准备为申请清理沟渠的村民服务。




七家子镇榆树村修建的高标准排涝支渠

二、科学巧干的标杆：通江口镇建设村

为充分发挥水利工程应有的效能，通江口镇建设村坚持打造精品工程，坚决保护百姓利益，从村党支部书记带领村班子、屯组党员干部和村民齐上阵，科学分工、职能明确，先难后易，建一处，成一处，用一处，他们以主干渠辐射支渠，实现了沟沟相连、沟渠相系、渠渠畅通。仅今年 10 月

28日至今就已经完成主干渠和支渠清淤12.1千米，其中包括干渠清淤2.8千米，支渠清淤9.3千米。同时，新建过水涵73处，为保障百姓农田耕作提供有利支撑。

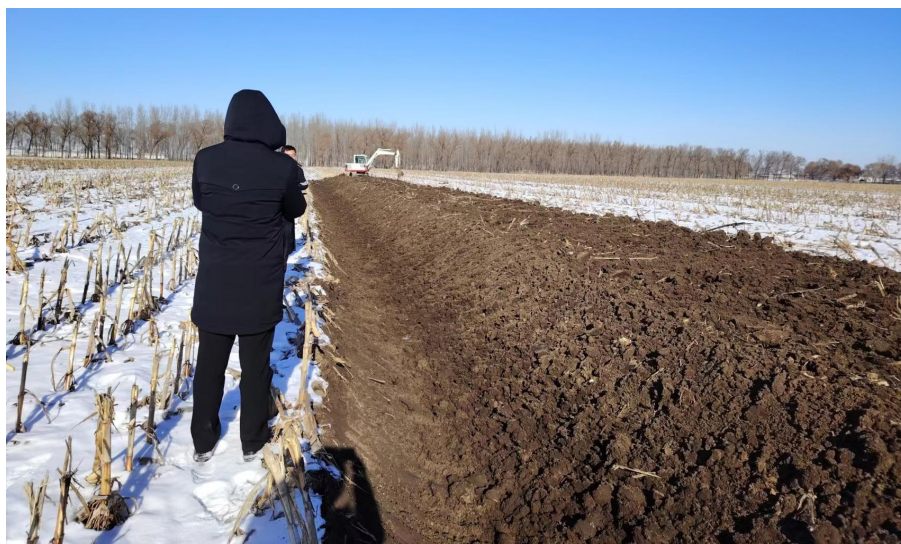

通江口镇建设村施工现场

此外，值得一提的是，建设村在联通沟渠的施工中实现了田间作业涵全覆盖，实现了让道路两侧百姓从道路直接入田耕作，既方便百姓农耕、又增加了生产效率，同时也减少了百姓因绕行其他耕地而发生的不必要的矛盾，他们还探索利用春耕的时机，将春耕与沟渠建设相结合，采取“包产到户”的方式，将每户农田所对应的沟渠进行修坡整形，实现一举两得。



通江口镇建设村全覆盖铺设渠耕涵管

七家子镇榆树村、通江口镇建设村今年开展的涝区治理工作规划得当、实施有力，取得良好效果，为保障当地农民粮食的增产增收打下了坚实基础。

希望各镇（农垦集团）、各村（分场），积极主动向七家子镇榆树村和通江口镇建设村对标看齐，加快工程进度及质量，抓住有限的利好时间，取得农田基本建设更好成绩！
